

資料文件  
2017年11月30日

大嶼山發展諮詢委員會  
交通運輸及地區改善項目小組  
文件第 03/2017 號

大嶼山發展諮詢委員會  
交通運輸及地區改善項目小組

大嶼山的地區改善工程項目的進度報告

目的

本文件旨在向小組委員匯報各項地區改善項目的進度（時間表載於附件一）。

地區改善項目

2. 八項地區改善項目的進度如下：

	工程項目	主要進度
1	大澳改善工程	第二期第一階段改善工程已於2016年9月開展，工程包括建造公共交通總站、公眾停車場、公眾休憩用地及附屬設施包括單車停放處、貨車及旅遊巴士泊位。預期於2019年第三季完成。
2	梅窩改善工程	第一期改善工程包括在梅窩熟食市場與銀河之間建造單車徑和行人道及在梅窩舊墟附近進行地區改善工程，於2017年1月已大致完成。  第二期第一階段的停車場改善

	工程項目	主要進度
		工程已於 2016 年 7 月開展，預期於 2019 年年初完成。
3	越野單車徑網絡	<p>除拾壘至梅窩越野單車徑之改善工程因當地村民反對而暫時擱置外，其餘第一期工程已於 2017 年 10 月大致完成。</p> <p>本署已於 2016 年 8 月聘請工程顧問進行第二期工程的設計工作，並已於 2016 年底展開工程前期準備工作。整項工程預期於 2018 年年底完成。</p>
4	羗山道的狹窄彎位改善工程	<p>已經完成 16 個路彎改善工程的其中 14 個，餘下 2 個改善工程的進展簡述如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 彎位 K10 - 工程現正進行中，預期於 2018 年第一季度完成。</li> <li>• 彎位 K15 - 工程現正進行中，預期於 2017 年年底完成。</li> </ul> <p>(有關彎位位置載於附件二)</p>
5	嶼南道的狹窄彎位改善工程	<p>已經完成 5 個路彎改善工程的其中 4 個，餘下的彎位 S1 工程預期在 2017 年 12 月動工，並於 2017 年年底完成。</p> <p>(有關彎位位置載於附件三)</p>

	工程項目	主要進度
6	檢討南大嶼的交通管制及封閉道路通行許可證安排	<p>「大嶼山自駕遊」自 2016 年實施至今，並廣受市民歡迎。</p> <p>運輸署會密切留意嶼南的交通及車位供應情況，再考慮實施第二階段措施(即增加額外 10 個旅遊巴士名額及 25 個私家車名額)的時間表。</p>
7	大嶼山郊遊徑的洗手間改善工程	<p>以先導形式更換有迫切需要取代的三個分別位於籬箕灣及煎魚灣的舊式旱廁。另外，本署亦會安排為南山營地的洗手間接駁自來水。</p> <p>預計以上有關工程將於 2018 年第一季展開，並分階段於 2018 年第三季前完成。</p>
8	賞花在昂坪	<p>種植工程建議在大嶼山昂坪一帶種植約 300 至 400 棵櫻花樹和本地春季開花的樹木。</p> <p>本署在 2017 年 9 月就有關種植工程諮詢離島區議會轄下旅遊漁農及環境衛生委員會，他們普遍支持是項種植工程。本署正進行種植工程的詳細設計，工程預計在 2018 年年初展開，預期在 2018 年年中完成。</p>

## 總結

3. 請小組委員備悉上述各項地區改善項目的進度，並發表意見。

土木工程拓展署  
2017年11月

大嶼山的地區改善工程項目的進度報告

日期： 2017年11月

	時間表	2017				2018	2019	2020	負責部門
		第1季	第2季	第3季	第4季				
<b>地區改善項目</b>									
1	大澳改善工程	第二期 第一階段：2016年9月至2019年第三季 第二期 第二階段：待定				第二期 第一階段			土木工程拓展署
2	梅窩改善工程	第一期：2014年7月至2017年1月 第二期 第一階段：2016年7月至2019年年初 餘下階段：設計及勘測：2018年年中至2020年初				第一期 第二期 第一階段 餘下階段			土木工程拓展署
3	越野單車徑網絡	第一期：2015年年底至2017年10月 第二期：2016年8月至2018年年底				第一期 第二期			土木工程拓展署
4	羗山道的狹窄彎位改善工程	彎位 K10： 施工：2016年10月至2018年第一季 彎位 K15： 施工：2017年第二季至2017年年底				K10 K15			路政署
5	嶼南道的狹窄彎位改善工程	彎位 S1 施工：2017年12月至2017年年底				S1			路政署
6	檢討南大嶼山的交通管制及封閉道路通行許可證安排	第一階段措施分別於2015年12月及2016年2月實施				已實施第一階段建議			運輸署
7	大嶼山郊遊徑的洗手間改善工程	施工：2018年第一季至2018年第三季							土木工程拓展署
8	賞花在昂坪	施工：2018年年初至2018年年中							土木工程拓展署


圖例：



前期工作：勘測、設計、申請撥款及招標



建造工程

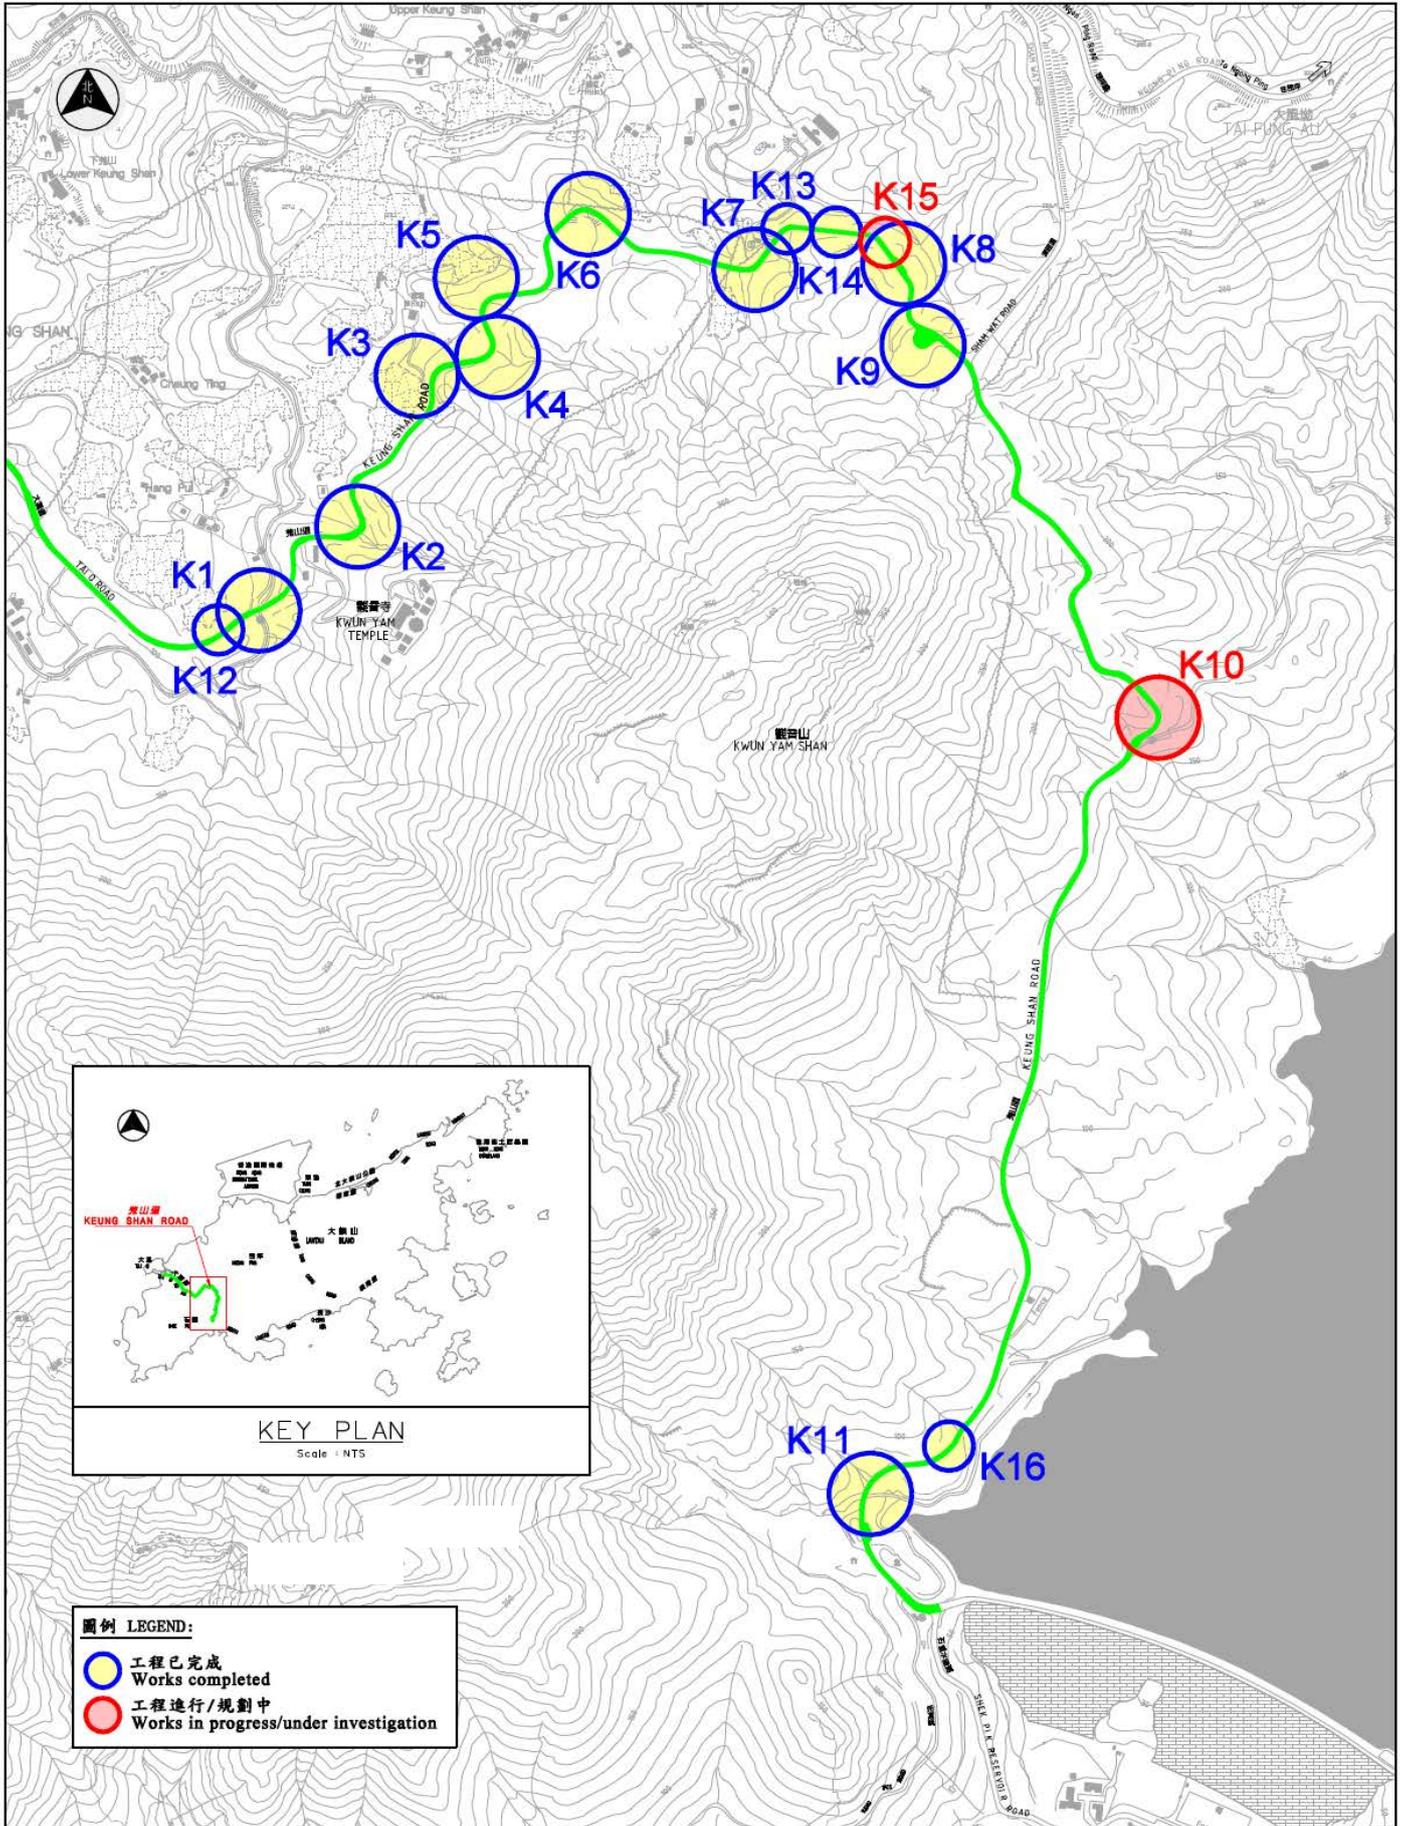

附件A - 羗山道彎位改善工程 (K1-K16)  
Annex A - Bend Improvement Works of Keung Shan Road (K1-K16)

